



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
339 CORO AV BOLIVAR	02/12/23	03

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
CATON	9155-10	BG514FBB02	10 KVA	2

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	RAFAEL TOVAR
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	EMPRESA:
	INVIG 2010 CA
	HORA DE INICIO:
	7 AM
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS		✓	DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR		✓	PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	✓	
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	215			7.5	7.2			209		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	124	125						121	121	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
0.06		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8	437	02/12/23	64	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
✓					

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Desmantelacion de cable #6 Rigido desde el Tubero T.com al equipo ups
- Desmantelacion de 64 BATERIAS DAÑADA 9H 12V
- Instalacion de 64 BATERIAS 9H 12V suministrada por el BANCO
- Instalacion de sala de control 50x40x90
- Instalacion y suministro de 3 Brackets de 2x80
- Instalacion y suministro de conmutador de 63 AMP
- Instalacion de BARRA TIERRA, NEUTRO

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Jenny Gauto	Tecno		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345


- Instalacion de 4 RAMPLU NARANJA, 4 TORNILLOS TIRAFONDO de 6 TORNILLO 3/4 x 8
- Instalacion y suministro de cable ST 4x6 cantidad 12 metros
- Instalacion de conector ojo de 1/4 PARA cable #6 = 14
- Instalacion de TIRAP - 25
- Instalacion de 2 conector puc de 1/4
- Instalacion de 1 conector ENT de 1 1/2
- Instalacion de 3 metros de TUBERIA FLEXIBLE de 1 1/2

Banco de Venezuela

OFICINA CORPOSA
PASAJE TALAVERA

El equipo ups respalda los siguientes puestos.

- 1 - RACK
- 1 = TESORERO
- 1 = GERENTE de SERVICIO
- 4 = ASESORES de NEGOCIOS
- 1 = GERENTE de NEGOCIOS
- 2 = ATC
- 13 = CAJA

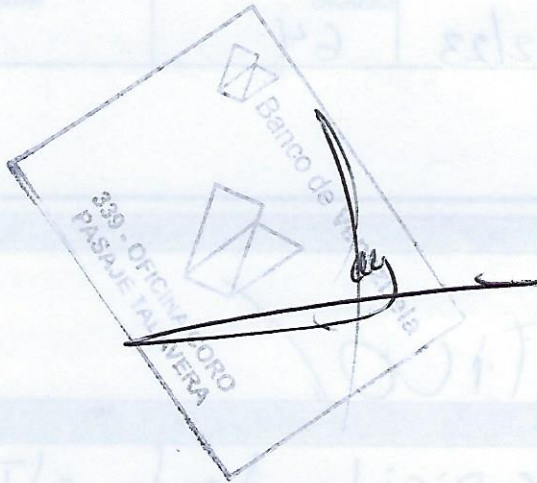

REVISIÓN Y CHEQUEO DE BATERÍAS				FECHA			
				02 / 12 / 23			
AGENCIA: <u>Coro Palaje Talavera</u>							
CODIGO DE AGENCIA: <u>339</u>				HORA DE INICIO:			
HORA DE CULMINACIÓN:							
CAPACIDAD DEL UPS KVA: <u>10</u>				MARCA DEL UPS: <u>Eaton</u>			
SERIAL UPS: <u>BG514FBB02</u>				CANTIDAD DE BANCOS DE BATERÍAS: <u>8</u>			
CANTIDAD DE BATERÍAS: <u>64</u>				12V9AH: <u>X</u> 12V5AH:			
Nº BATERÍA	VOLTAJE	% DE CARGA	OBSERVACIÓN	Nº BATERÍA	VOLTAJE	% DE CARGA	OBSERVACIÓN
1	12,49	79%		33	12,59	84%	
2	12,44	77%		34	12,61	84%	
3	12,45	78%		35	12,61	84%	
4	12,55	82%		36	12,59	84%	
5	12,51	80%		37	12,46	78%	
6	12,53	81%		38	12,59	84%	
7	12,52	81%		39	12,56	82%	
8	12,51	80%		40	12,51	80%	
9	12,55	82%		41	12,29	69%	
10	12,53	81%		42	12,35	73%	
11	12,43	77%		43	12,40	75%	
12	12,51	80%		44	12,39	75%	
13	12,47	79%		45	12,34	72%	
14	12,50	80%		46	12,29	69%	
15	12,50	80%		47	12,43	77%	
16	12,54	82%		48	12,39	75%	
17	12,58	83%		49	12,39	75%	
18	12,48	79%		50	12,34	72%	
19	12,53	81%		51	12,42	76%	
20	12,56	82%		52	12,31	71%	
21	12,52	81%		53	12,44	77%	
22	12,54	82%		54	12,39	75%	
23	12,53	81%		55	12,32	71%	
24	12,56	82%		56	12,41	76%	
25	12,58	83%		57	12,39	75%	
26	12,54	82%		58	12,27	68%	
27	12,55	82%		59	12,38	74%	
28	12,54	82%		60	12,31	71%	
29	12,55	82%		61	12,60	84%	
30	12,57	83%		62	12,56	82%	
31	12,59			63	12,58	74%	
32	12,54			64	12,48	79%	

REALIZADO POR: _____
